



सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय
डडेल्धुरा

आ.व. २०७९/८० को बार्षिक प्रगति समिक्षा

मिति: २०८०।०४।०८ र ०९ गते
स्थान: भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

प्रस्तुतकर्ता:
रामरथ खरेल
डिभिजन प्रमुख

कार्यालयको संक्षिप्त जानकारी


शिर्षक	विवरण
कार्यालयको परिचय	२०७५ सालमा प्रदेश सरकार अन्तर्गत जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय डडेलधुराको स्थापना भएको हो । यसकार्यालयबाट सिंचाई सम्बन्धी बाँध कलौ निर्माण तथा मर्मत र नदीनियन्त्रण (जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण) सम्बन्धी विभिन्न संरचनाहरूको निर्माण तथा संरक्षण गर्ने कार्य गरिन्छ ।
कार्यालयको अवस्था	भुक्म्पले गर्दा कार्यालयहरूको भवन चर्किएकोले पुन निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यक देखिएको साथै सम्पूर्ण योजनाहरूको सम्झौता हुने क्रम जारी रहेको र केही योजनाहरू कार्यान्वयनमा रहेको ।

१ कर्माचारी दरबन्दी तथा पदपुर्ति बिबरण

सि.नं.	पद	स्वीकृत दरवन्दी	पुर्ति दरवन्दी	रिक्त दरवन्दी
१	सिनियर डिभिजनल ईन्जिनियर (डि.प्र.)	१	१	—
२	ईन्जिनियर	२	—	२
३	सब ईन्जिनियर	३	३	—
४	लेखापाल	१	१	—
५	नायव सुव्वा	१	१	—
६	ए.ओ.	१	१	जलश्रोत तथा सि.वि.डि.का. कैलालीमाकाजमा
७	कार्यालय सहयोगी	२	२	—
	जम्मा	११	१०	२


ब.उ.शि.न. ३३७०३०११४ जलश्रोत तथा सिचाई विकास

■ तटबन्ध ■ सिचाई ■ जम्मा

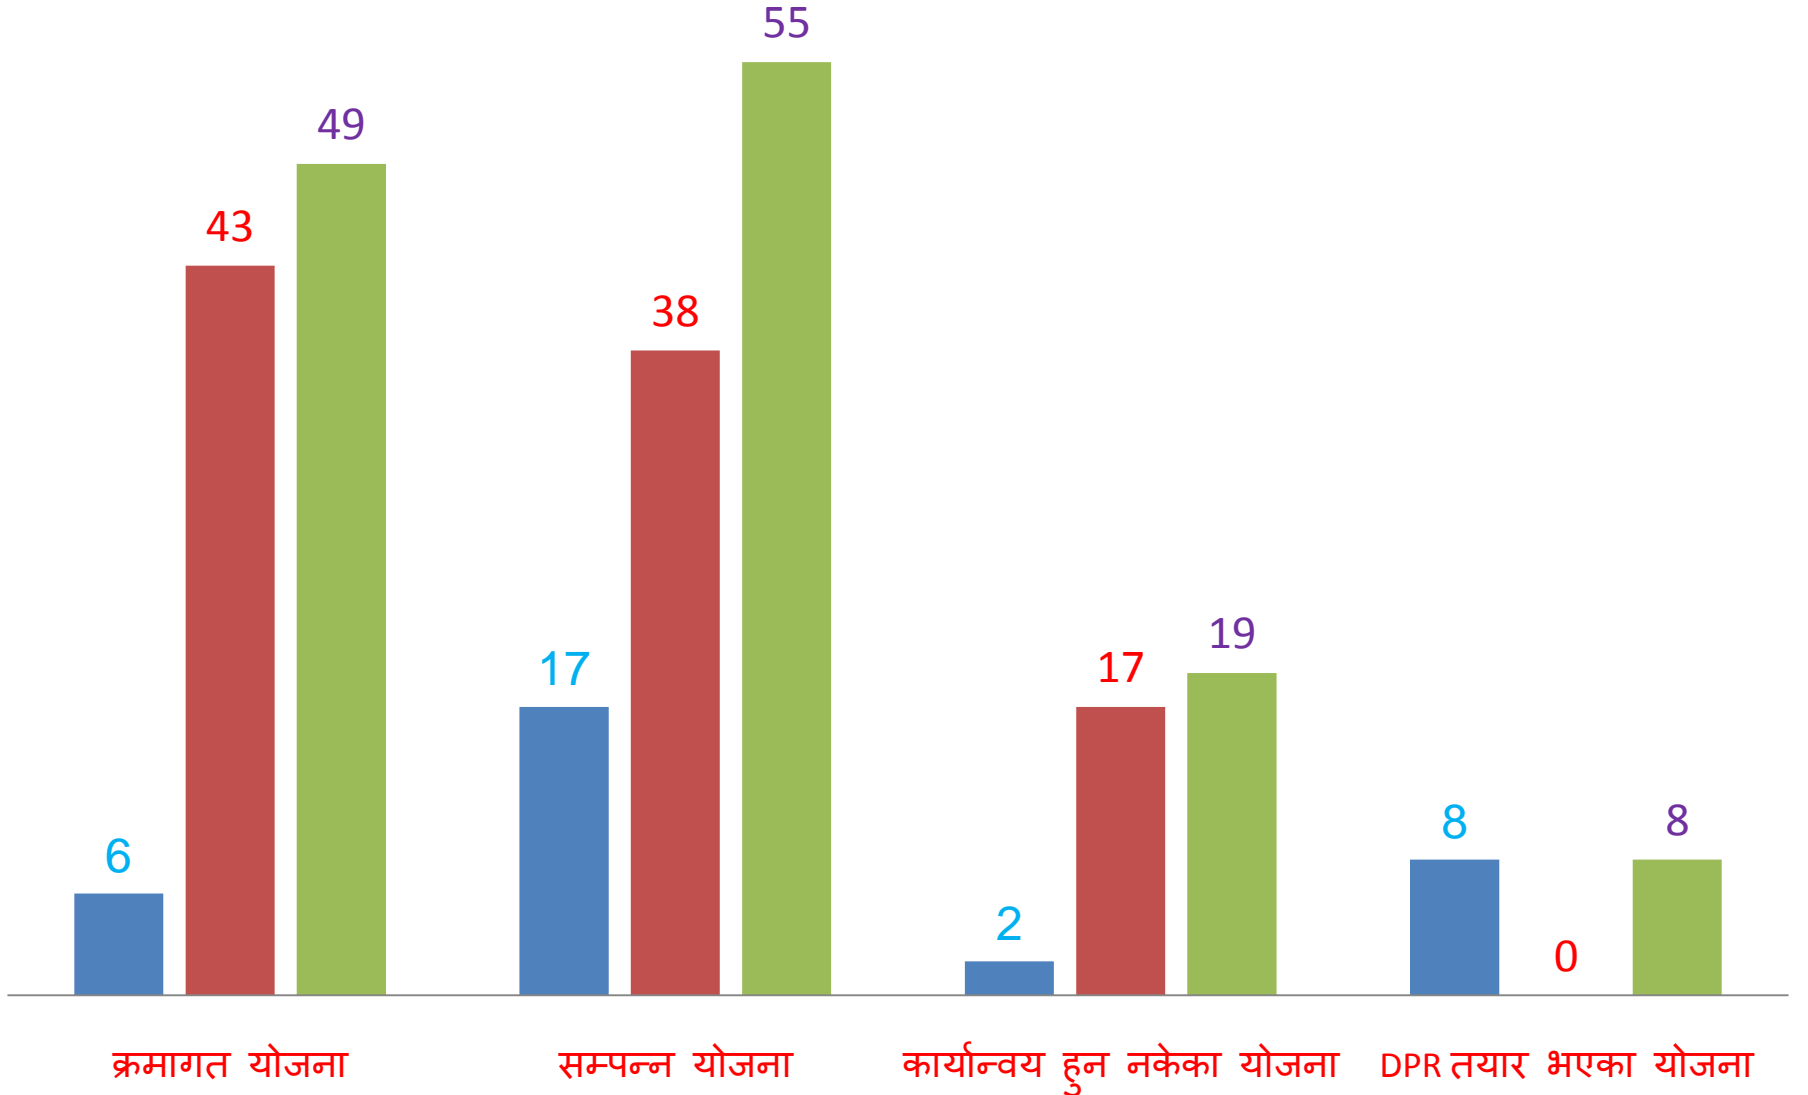

ब.उ.शि.न. ३३७९११२२ नदी नियन्त्रण (संघ शसर्त अनुदान)

■ तटबन्ध ■ सिचाई ■ जम्मा

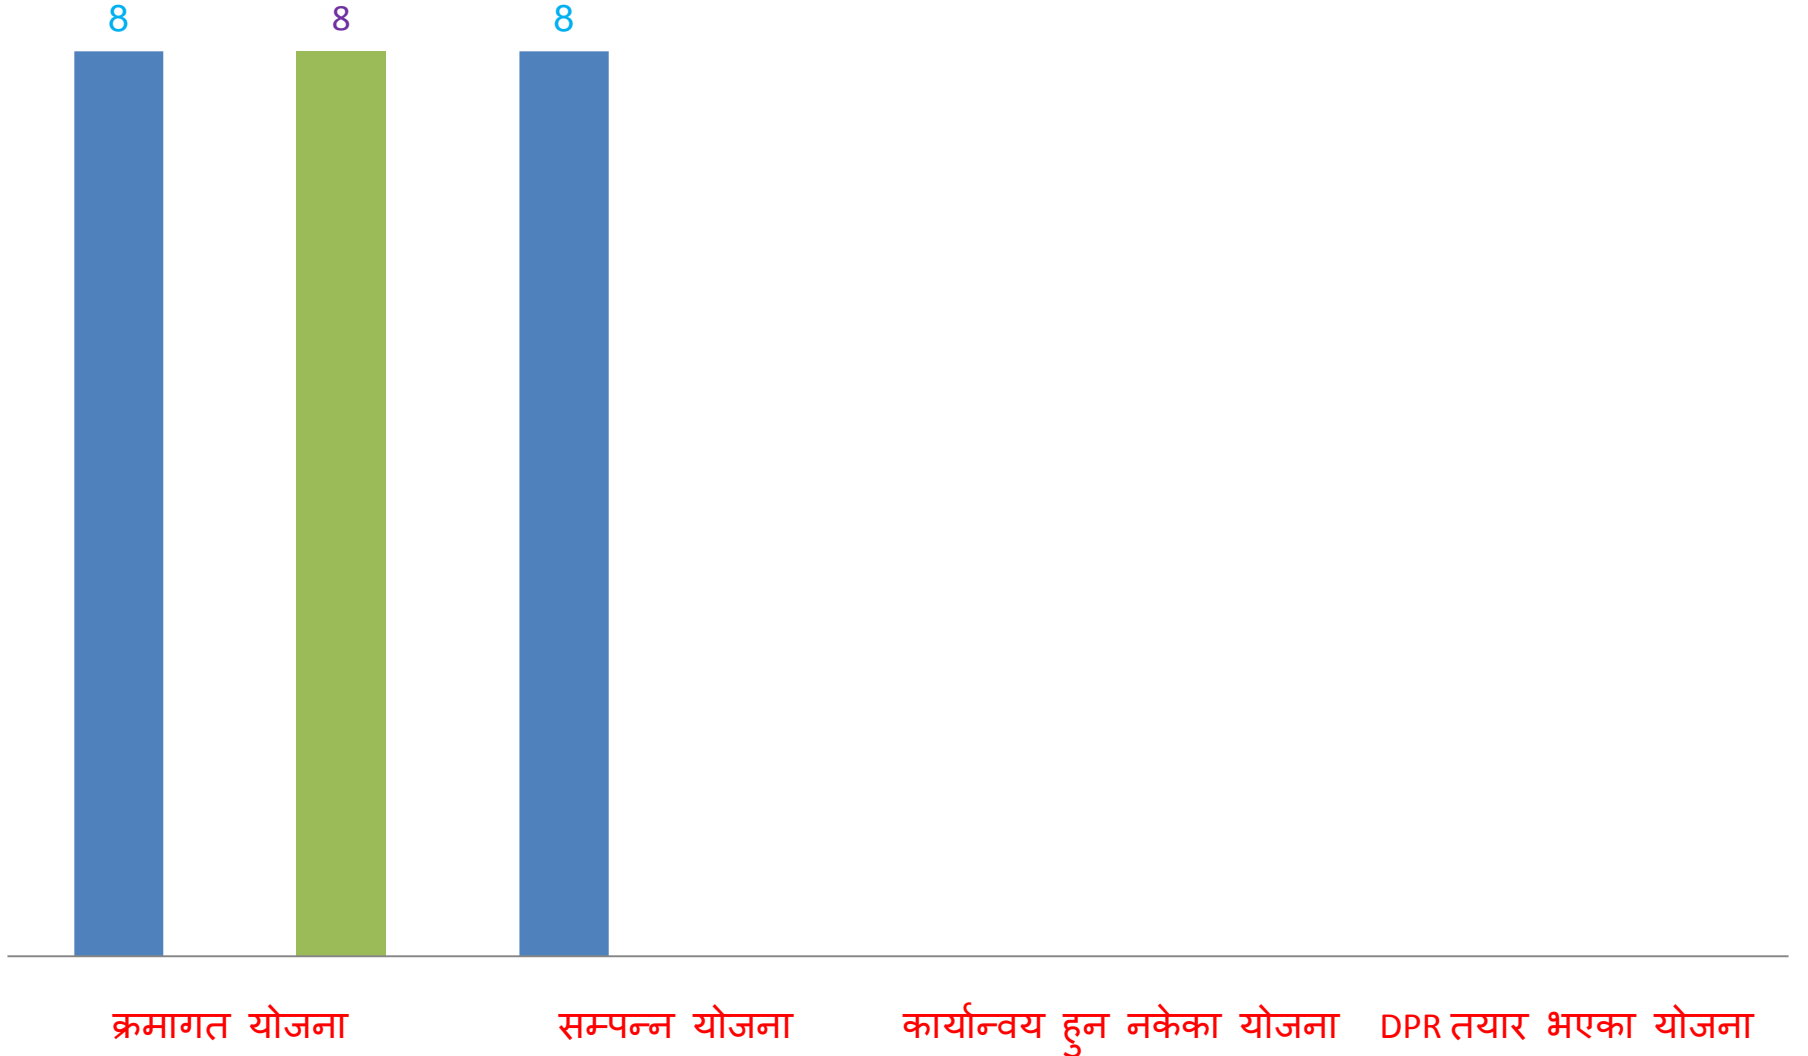

ब.उ.शि.न. ३३७९११२३ मर्मत संभार आयोजनाहरु(संघ शसर्त अनुदान)

■ तटबन्ध ■ सिचाई ■ जम्मा



क्रमागत योजना

सम्पन्न योजना

कार्यान्वय हुन नकेका योजना DPR तयार भएका योजना

ब.उ.शि.न. ३३७९११२६ मझौला सिंचाई आयोजना(संघ शसर्त अनुदान)

■ तटबन्ध ■ सिंचाई ■ जम्मा




क्रमागत योजना

सम्पन्न योजना

कार्यान्वय हुन नकेका योजना DPR तयार भएका योजना


ब.उ.शि.न. ३३७९११२७ सेती महाकाली सिंचाई विकास कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)

■ तटबन्ध ■ सिंचाई ■ जम्मा

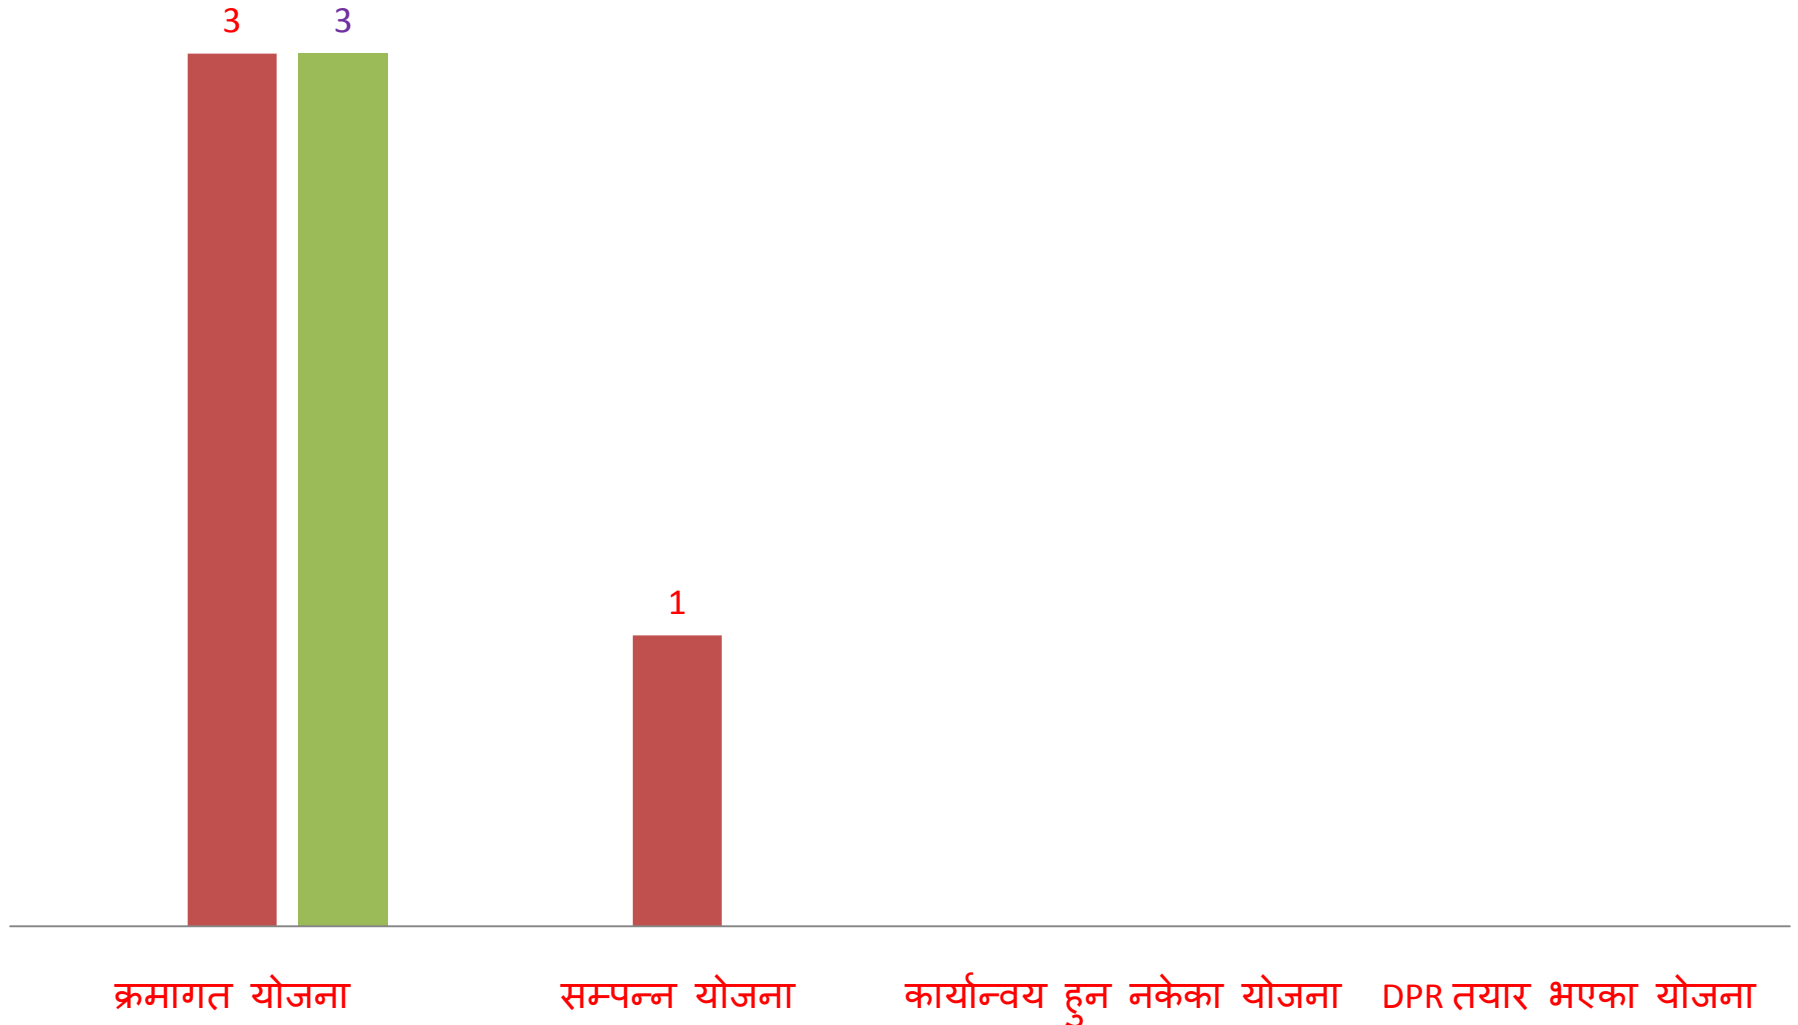

ब.उ.शि.न. ३३७९११४१ एकीकृत उर्जा तथा सिंचाई विशेष कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)

■ तटबन्ध ■ सिंचाई ■ जम्मा




क्रमागत योजना

सम्पन्न योजना

कार्यान्वय हुन नकेका योजना DPR तयार भएका योजना


ब.उ.शि.न. ३३७९११४३ नयाँ प्रविधिमा आधारित नदि नियन्त्रण कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)

■ तटबन्ध ■ सिचाई ■ जम्मा

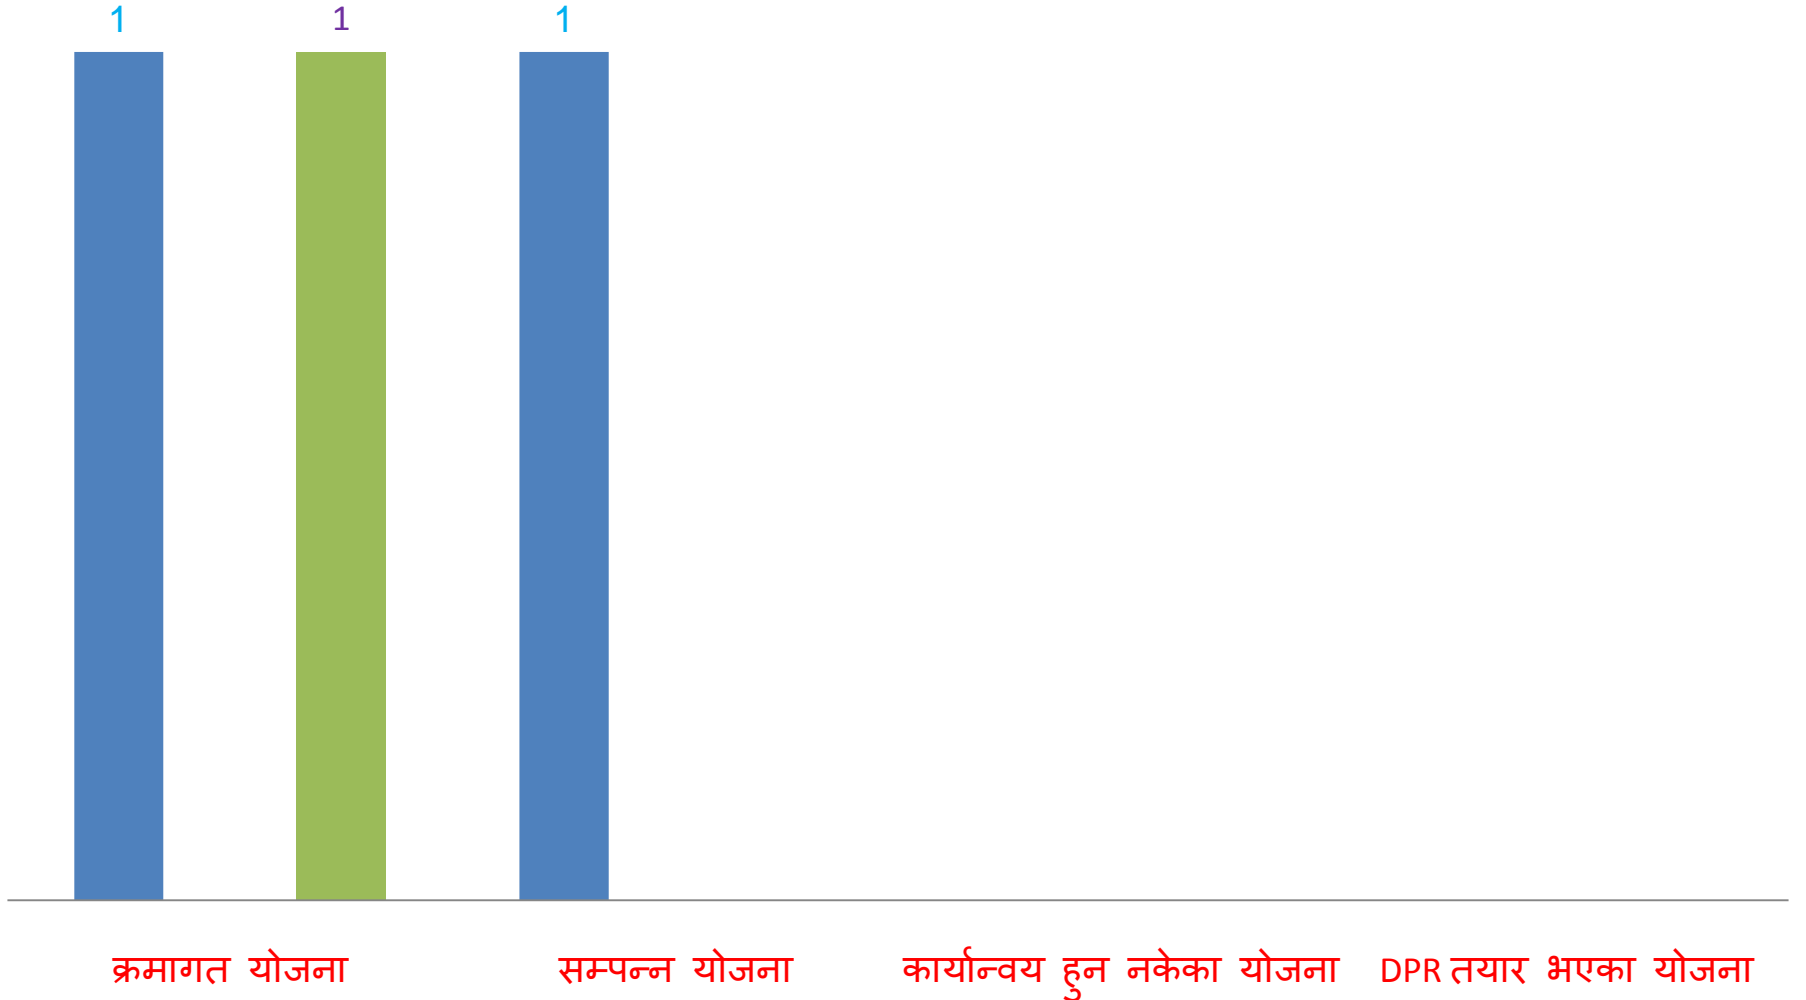


तेश्रो चौमासिक/बार्षिक बजेट-खर्च तथा भौतिक-बित्तिय विवरण

■ बजेट (रु.लाखमा) ■ खर्च (रु.लाखमा) ■ भौतिक प्रगति ■ बित्तिय प्रगति

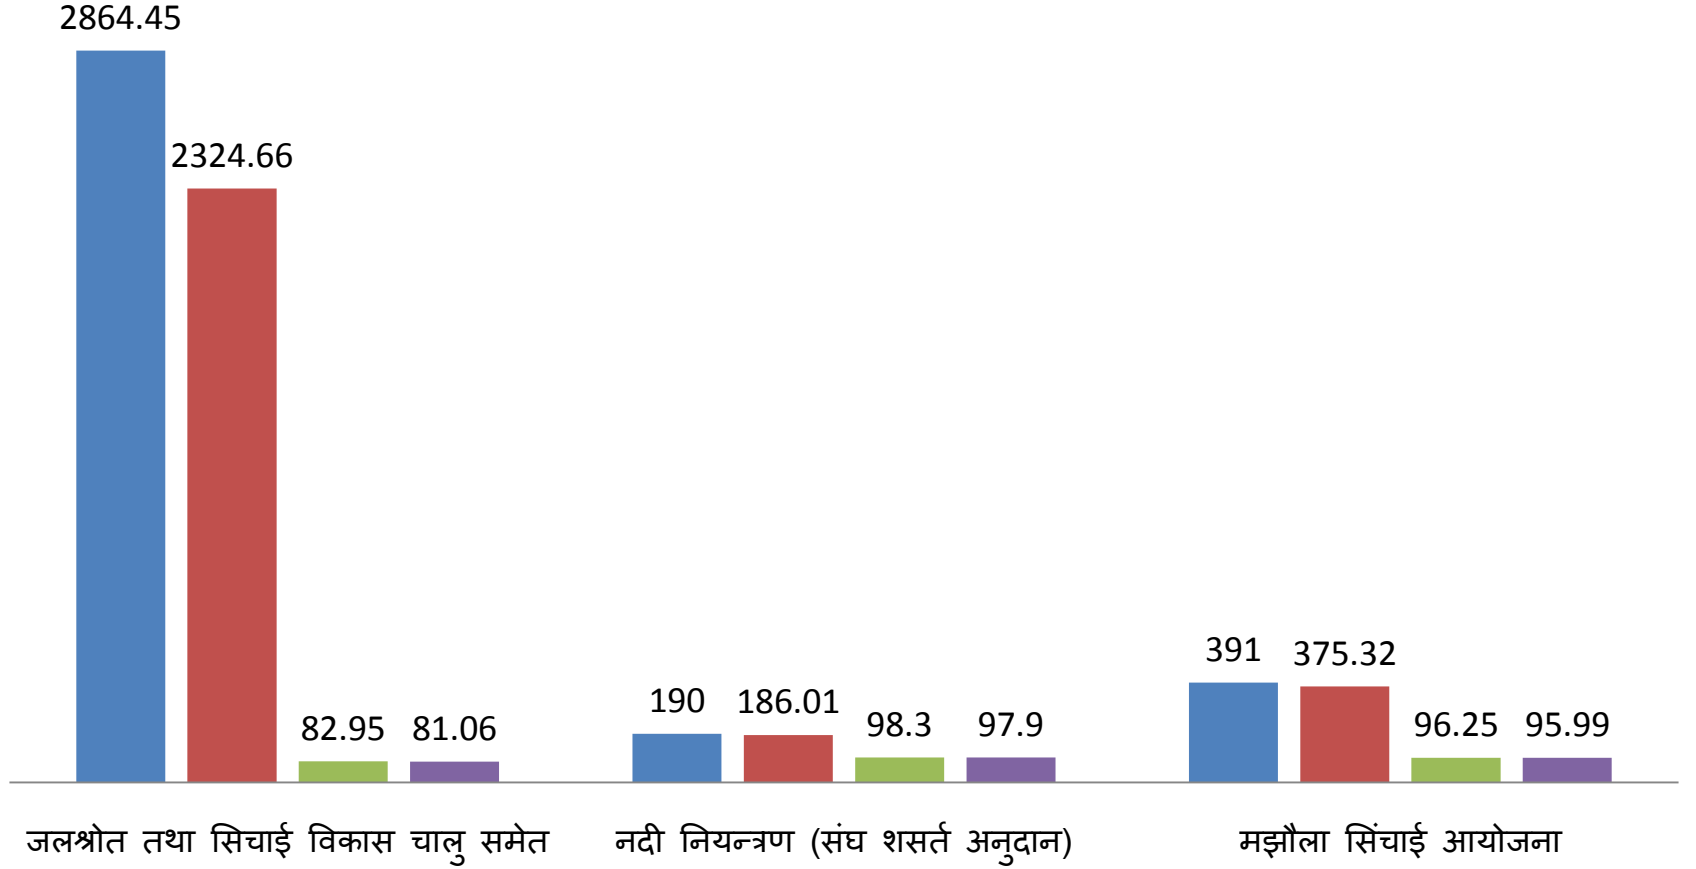


तेश्रो चौमासिक/बार्षिक बजेट-खर्च तथा भौतिक-बित्तिय विवरण

■ बजेट (रु.लाखमा) ■ खर्च (रु.लाखमा) ■ भौतिक प्रगति ■ बित्तिय प्रगति

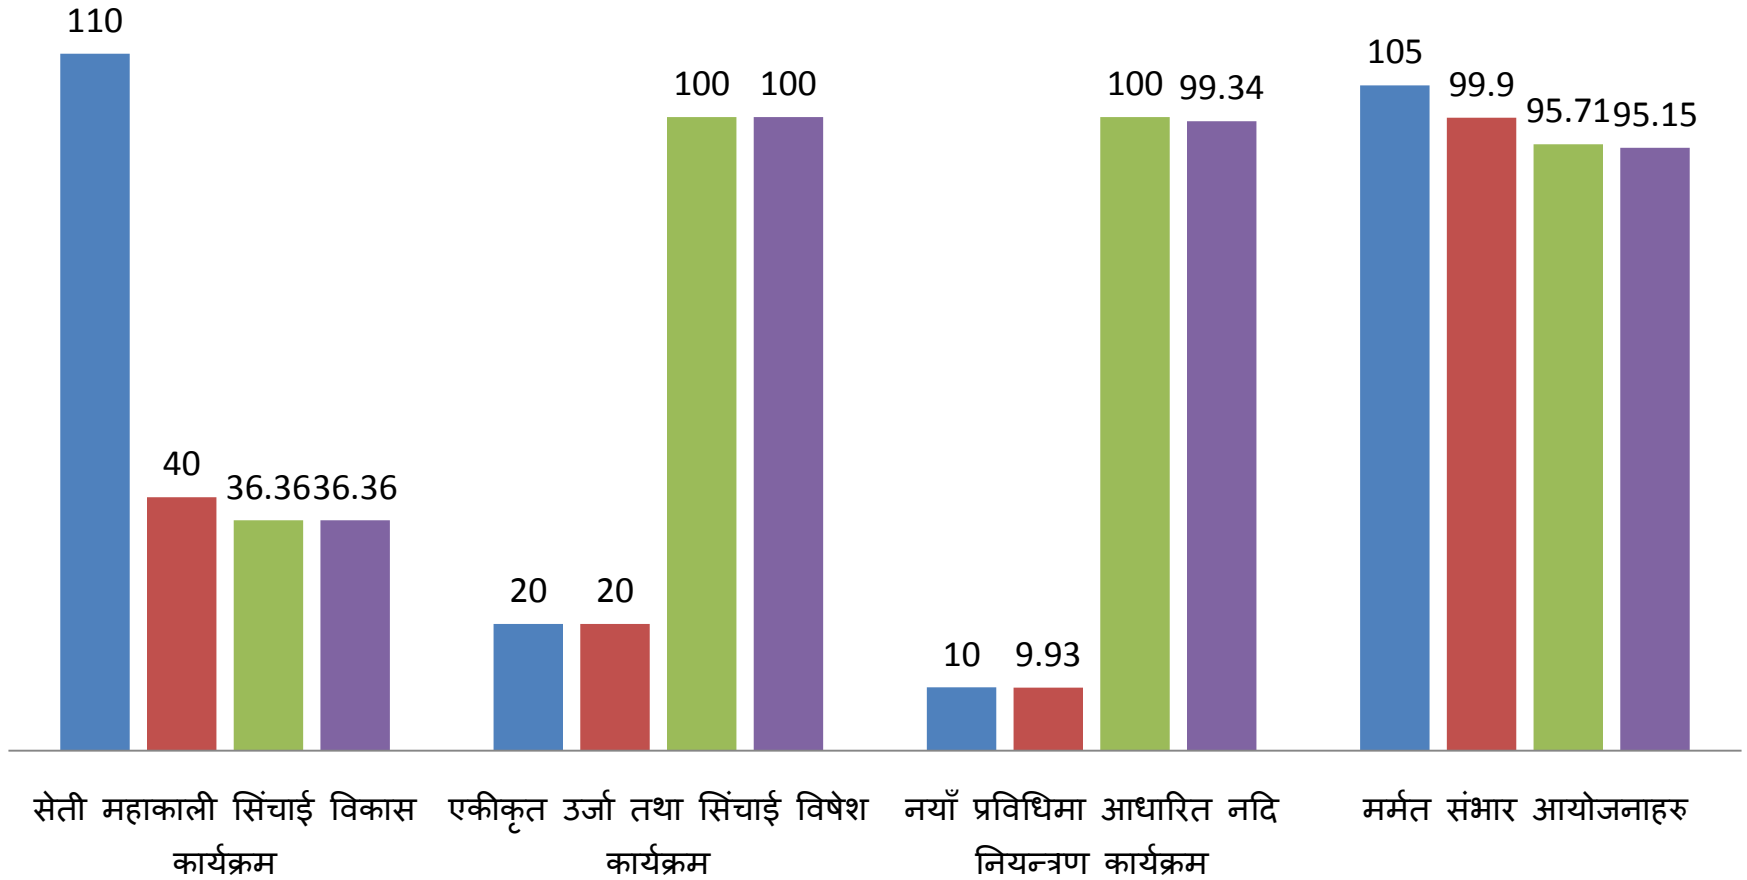

२.२ कुल जम्मा योजनाहरुको विवरण

■ तटबन्ध तर्फ ■ सिचाई तर्फ ■ जम्मा

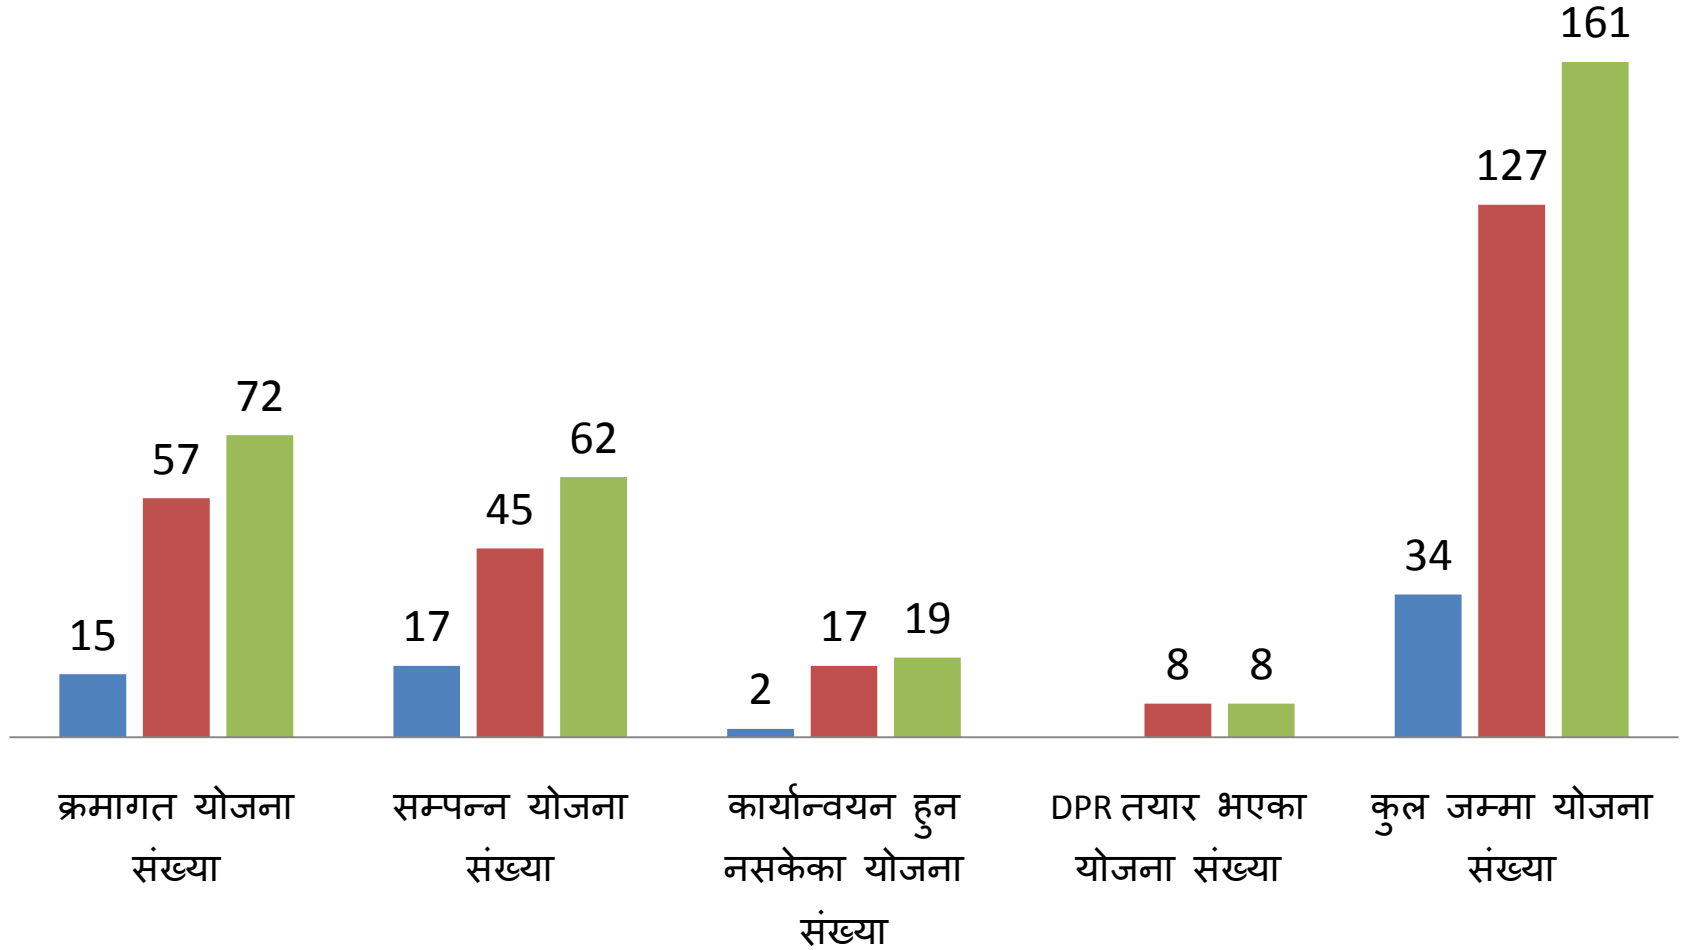

तेश्रो चौमासिक/ बार्षिक बजेट-खर्च विवरण

■ बजेट (रु.लाखमा) ■ खर्च (रु.लाखमा)

3690.25



3055.82




बजेट (पुजीगत र
चालु समेत)

खर्च (पुजीगत र
चालु समेत)

भौतिक-बित्तीय विवरण

■ भौतिक प्रगति ■ बित्तीय प्रगति

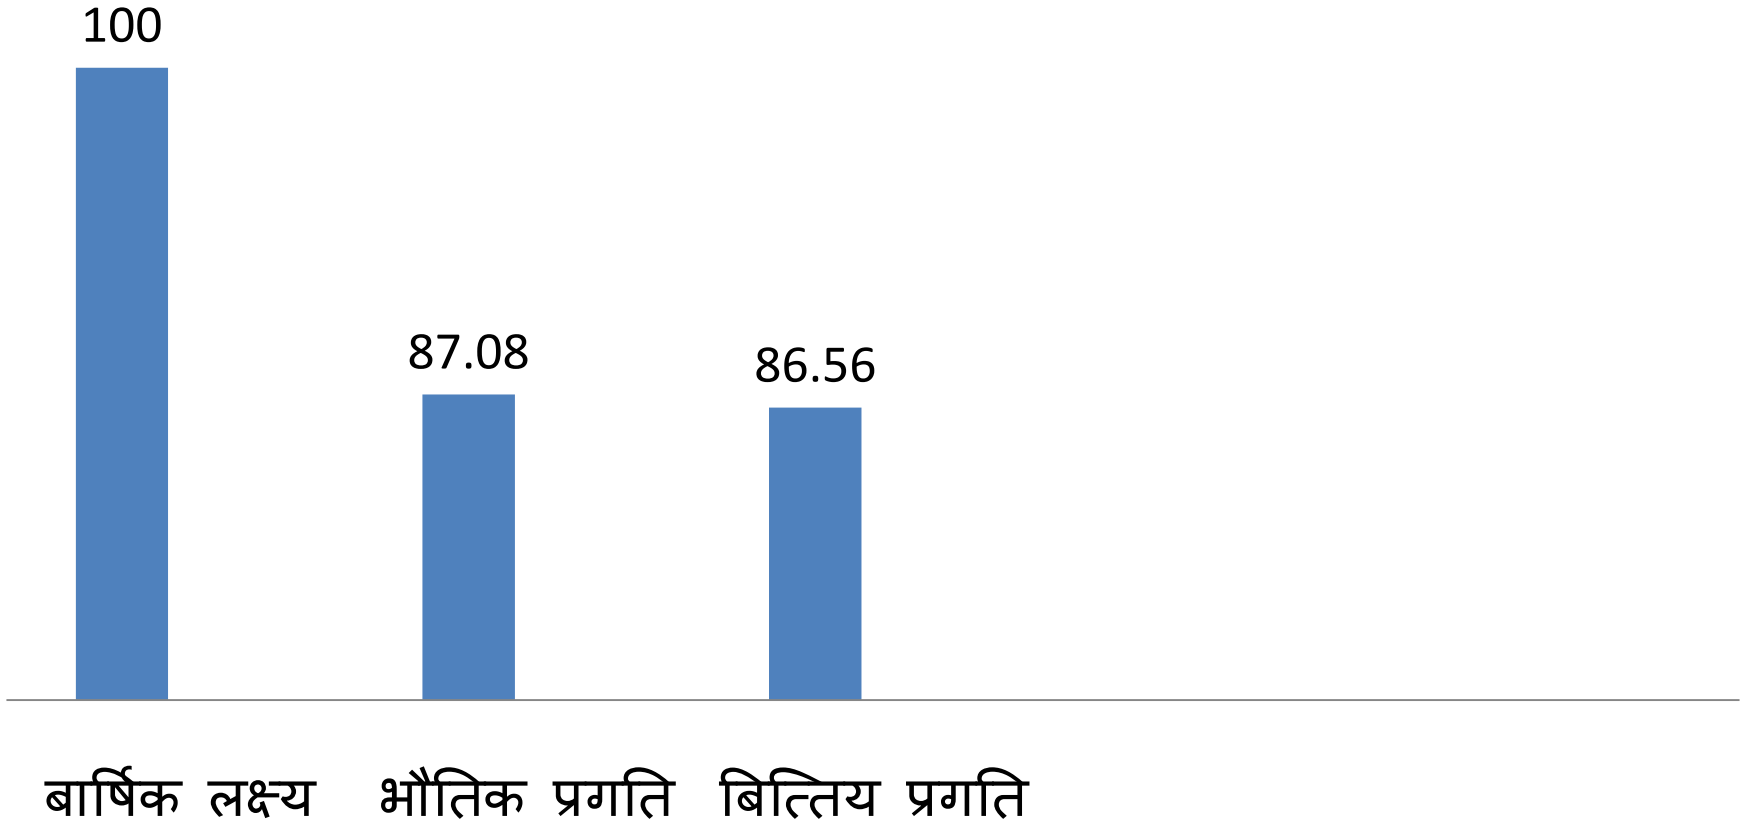

उपलब्धी सुचक बमोजिम

सि.नं.	सूचकहरु (Key Indicators)	इकाई	कुल उपलब्धी	कैफियत
१	सिंचाई			
१.१	सतह सिंचाई आयोजनाहरू बाट सिंचित क्षेत्रफल विस्तार	हेक्टर	३२८९	
१.२	भूमिगत सिंचाई आयोजनाहरू बाट सिंचित क्षेत्रफल विस्तार	हेक्टर	०	
१.३	नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाई आयोजनाहरू बाट सिंचित क्षेत्रफल विस्तार	हेक्टर	०	
१.४	मर्मत संभार/पुनःनिर्माण बाट हुने सिंचित क्षेत्रफल	हेक्टर	९६	
१.५	पक्क कुलो निर्माण	कि.मि.	१५	
१.६	पाईप लाईन निर्माण	कि.मि.	३८	
१.७	आर सि सि पोखरी निर्माण	गोटा	४२	
२	तटबन्ध-नदि/पहिरो नियन्त्रण			
२.१	तटबन्ध निर्माण	कि.मी	७	
२.२	जमिनको उकास (Reclaim)	हेक्टर	५	

✓ लाभिन्वत जनसंख्या: २५३४६ जना

बेरुजु/ बेरुजु फछ्यौटको स्थिति

आ.व.	सि. नं.	बेरुजु दफा नं.	बेरुजुको छोटकरी व्यहोरा	बेरुजु रकम	फछ्यौट रकम	बेरुजु फछ्यौट प्रतिशत	बांकी बेरुजु	कैफियत
आ.व. २०७४/०७५ सम्मको	१		असुल गर्नु पर्ने			०		०
	२		अनियमित भएका	०		०		०
	३		प्रमाण कागजात नपुगेको	०		०		०
	४	७	पेशकी बांकी	९८३०००	९८३०००			०
	५		सोधभर्ना	०		०	०	०
आ.व. २०७५/०७६ सम्मको जम्मा				९८३०००	९८३०००	१००.००	०	०
आ.व. २०७५/०७६	१	१८ १९ २० २३,२४	असुल गर्नु पर्ने	१८३९२६	१८३९२६			०
	२		अनियमित भएका					०
	३		प्रमाण कागजात नपुगेको					०
	४	२५	पेशकी बांकी	४६०१०००	४६०१०००			०
	५		सोधभर्ना					०
आ.व.२०७५/०७६ को जम्मा				४७८४९२६	४७८४९२६	१००.००	०	०
आ.व. २०७६/०७७	१	११.२ १२	असुल गर्नु पर्ने	६६८००४	६६८००४			सम्परिक्षणकोलागी ० म ले प मा पेश भएको
	२	९,१०,११.३	अनियमित भएका	१११४४६५१	२२७८५५		१०९१६७९६	" "
	३	१७	प्रमाण कागजात नपुगेको	१४६२७९७			१४६२७९७	
	४	२०	पेशकी बांकी	१०१००००	१०१००००		०	
	५		सोधभर्ना					
आ.व २०७६/०७७को जम्मा				१४२८५४५३	१९०५८६०	१३.३४	१२३७९५९३	

बेरुजु/ बेरुजु फछ्यौटको स्थिति

रकम रु. हजारमा

आ.व.	सि. नं.	बेरुजु दफा नं.	बेरुजुको छोटकरी व्यहोरा	बेरुजु रकम	आ.व. ०७९/८० फागुन मसान्तसम्म फछ्यौट बेरुजु रकम	बेरुजु फछ्यौट प्रतिशत	बांकी बेरुजु	कैफियत
आ.व. २०७७/०७८	१	९ १२.१ १२.२ १३.१ १३.२ १४	असुल गर्नु पर्ने	४७९५६४	४७९५६४		०	
	२		अनियमित भएका	०			०	
	३		प्रमाण कागजात नपुगेको				०	
	४		पेशकी बांकी					
	५		सोधभर्ना					
आ.व २०७७/०७८ को जम्मा				४७९५६४	४७९५६४	१००.००	०	
आ.व. २०७८/०७९	१	१८	असुल गर्नु पर्ने	२८२१८१	२८२१८१		०	
	२	१५ २० २४	अनियमित भएका	१३१६०३०३			१३१६०३०३	कर समायोजन पत्र पेश गर्न ताकेता भै रहेको
	३		प्रमाण कागजात नपुगेको	०			०	
	४		पेशकी बांकी	०			०	
	५		सोधभर्ना	०			०	
आ. व. २०७८/०७९ को जम्मा				१३४४२४८४	२८२१८१	२.१०	१३१६०३०३	
हालसम्म को कूल जम्मा				३३९७५४२६	८४३५५३०	२४.८३	२५५३९८९६	

समस्याहरु

१ दरवन्दी भएको तर ईन्जिनियर नभएको ।

समस्या समाधानको लागि सुझावहरु

मौजुदा जनशक्ती बाट धेरै खटन पटन गरि काम गराएको ।

Please compile in progress report as well

फोटोग्राफहरु :

बगरकोट सिचाई योजना भागेश्वर ४



बन्नताल ठुलाखेत सिचाई योजना, आलिताल १, डडेल्धुरा



भरण सिचाई योजना अजयमेरु ६



कोलाघाडी चौड सिचाइ योजना ,आलिताल गा पा-3 निर्माणाधिन पोखरी



भागेश्वर सिचाई कुलो निर्माण योजना भागेश्वर २



राडिल सि यो भागेश्वर ३ डडेल्धुरा



सेउराडी सिंचाइ योजना, आलीताल ४, जालखेत, डडेल्धुरा



रंगुन नदी नियन्त्रण निर्माणाधिन प.न.पा



साधनी लिफ्ट सिचाई योजना प.न.पा.

- [Phpto\10000000_96675806299821_88_568751720953316879_n.mp4](#)



सुन्दरनगर तल्लो भावर सिचाइ योजना ,आलिताल गा पा -5



झतडा सि यो नवदुर्गा ३



रौटपानीनाली लिफ्ट सि.यो. गन्यापधुरा ३

- [Phpto\361120126 4771674766289573 8753
093314629927685 n.mp4](#)

धन्यवाद
